GRIVEAU SARL

PLANNING TCE

IND 0 =>PREMIERE DIFFUSION =>

PROMOGIM
AULNAY SOUS BOIS

N°	Nom de la tâche	Début	Fin
1	ORDRE DE SERVICE	E DE SERVICE /10	31/10
2	PREPARATION	PREPARATION 2/11	30/11
3	TEMOINS	20/05	28/06
4	INSTALLATION DE CHANTIER	INSTALLATION DE CHANTIER 03/12	21/12
5	LOT N°0B TERRASSEMENTS	LOT N°0B TERRASSEMENTS 03/12	18/01
6	TERRASSEMENTS GENERAUX	TERRASSEMENTS GENERAUX 03/12	18/01
7	LOT N°0C PAROIS EN CONDITIONS SPECIALES	LOT N°0C PAROIS EN CONDITIONS SPECIALES 10/12	11/01
8	VOILES PAR PASSES	VOILES PAR PASSES 10/12	11/01
9	LOT N °01 GROS ŒUVRE	LOT N °01 GROS ŒUVRE 07/01	20/12
10	MONTAGE GRUE	MONTAGE GRUE 07/01	11/01
11	FONDATIONS CUVETTES	FONDATIONS CUVETTES 14/01	01/02
12	CANALISATIONS DALLAGE	CANALISATIONS DALLAGE 21/01	22/02
13	SOUS SOL	SOUS SOL 21/01	22/03
14	POTEAUX VOILES	POTEAUX VOILES 21/01	08/02
15	POUTRES	POUTRES 04/02	08/03
16	PLANCHER + RAMPE	PLANCHER + RAMPE 18/02	22/03
17	RDC	RDC 11/03	12/04
18	VERTICAUX	VERTICAUX 11/03	05/04
19	PLANCHER BALCONS	PLANCHER BALCONS 25/03	12/04
20	1° ETAGE	1° ETAGE 01/04	30/04
21	VERTICAUX	VERTICAUX 01/04	19/04
22	PLANCHER BALCONS	PLANCHER BALCONS 15/04	30/04
23	2° ETAGE	2° ETAGE 22/04	22/05
24	VERTICAUX	VERTICAUX 22/04	10/05
25	PLANCHER BALCONS	PLANCHER BALCONS 02/05	22/05
26	3° ETAGE	3° ETAGE 23/05	07/06
27	VERTICAUX	VERTICAUX 23/05	07/06
28	PLANCHER BALCONS	PLANCHER BALCONS 27/05	07/06
29	4° ETAGE	4° ETAGE 03/06	21/06
30	VERTICAUX	VERTICAUX 03/06	14/06
31	PLANCHER	PLANCHER 10/06	21/06
32	5° ETAGE	5° ETAGE 17/06	05/07
33	VERTICAUX	VERTICAUX 17/06	28/06
34	PLANCHER	PLANCHER 24/06	05/07
35	TERRASSES	TERRASSES 01/07	12/07
36	APPUIS SEUILS	APPUIS SEUILS 20/05	12/07
37	DEMONTAGE GRUE	DEMONTAGE GRUE 29/07	02/08
38	BASSIN DE RETENTION	BASSIN DE RETENTION 01/07	19/07
39	FLOCAGE	FLOCAGE 18/11	20/12
40	FINITIONS	FINITIONS 03/06	27/09
41	LOT N°02 RAVALEMENT	LOT N°02 RAVALEMENT 02/09	11/10
42	RAVALEMENT EXTERIEUR	RAVALEMENT EXTERIEUR 02/09	11/10
43	PLAQUETTE	PLAQUETTE 09/09	04/10

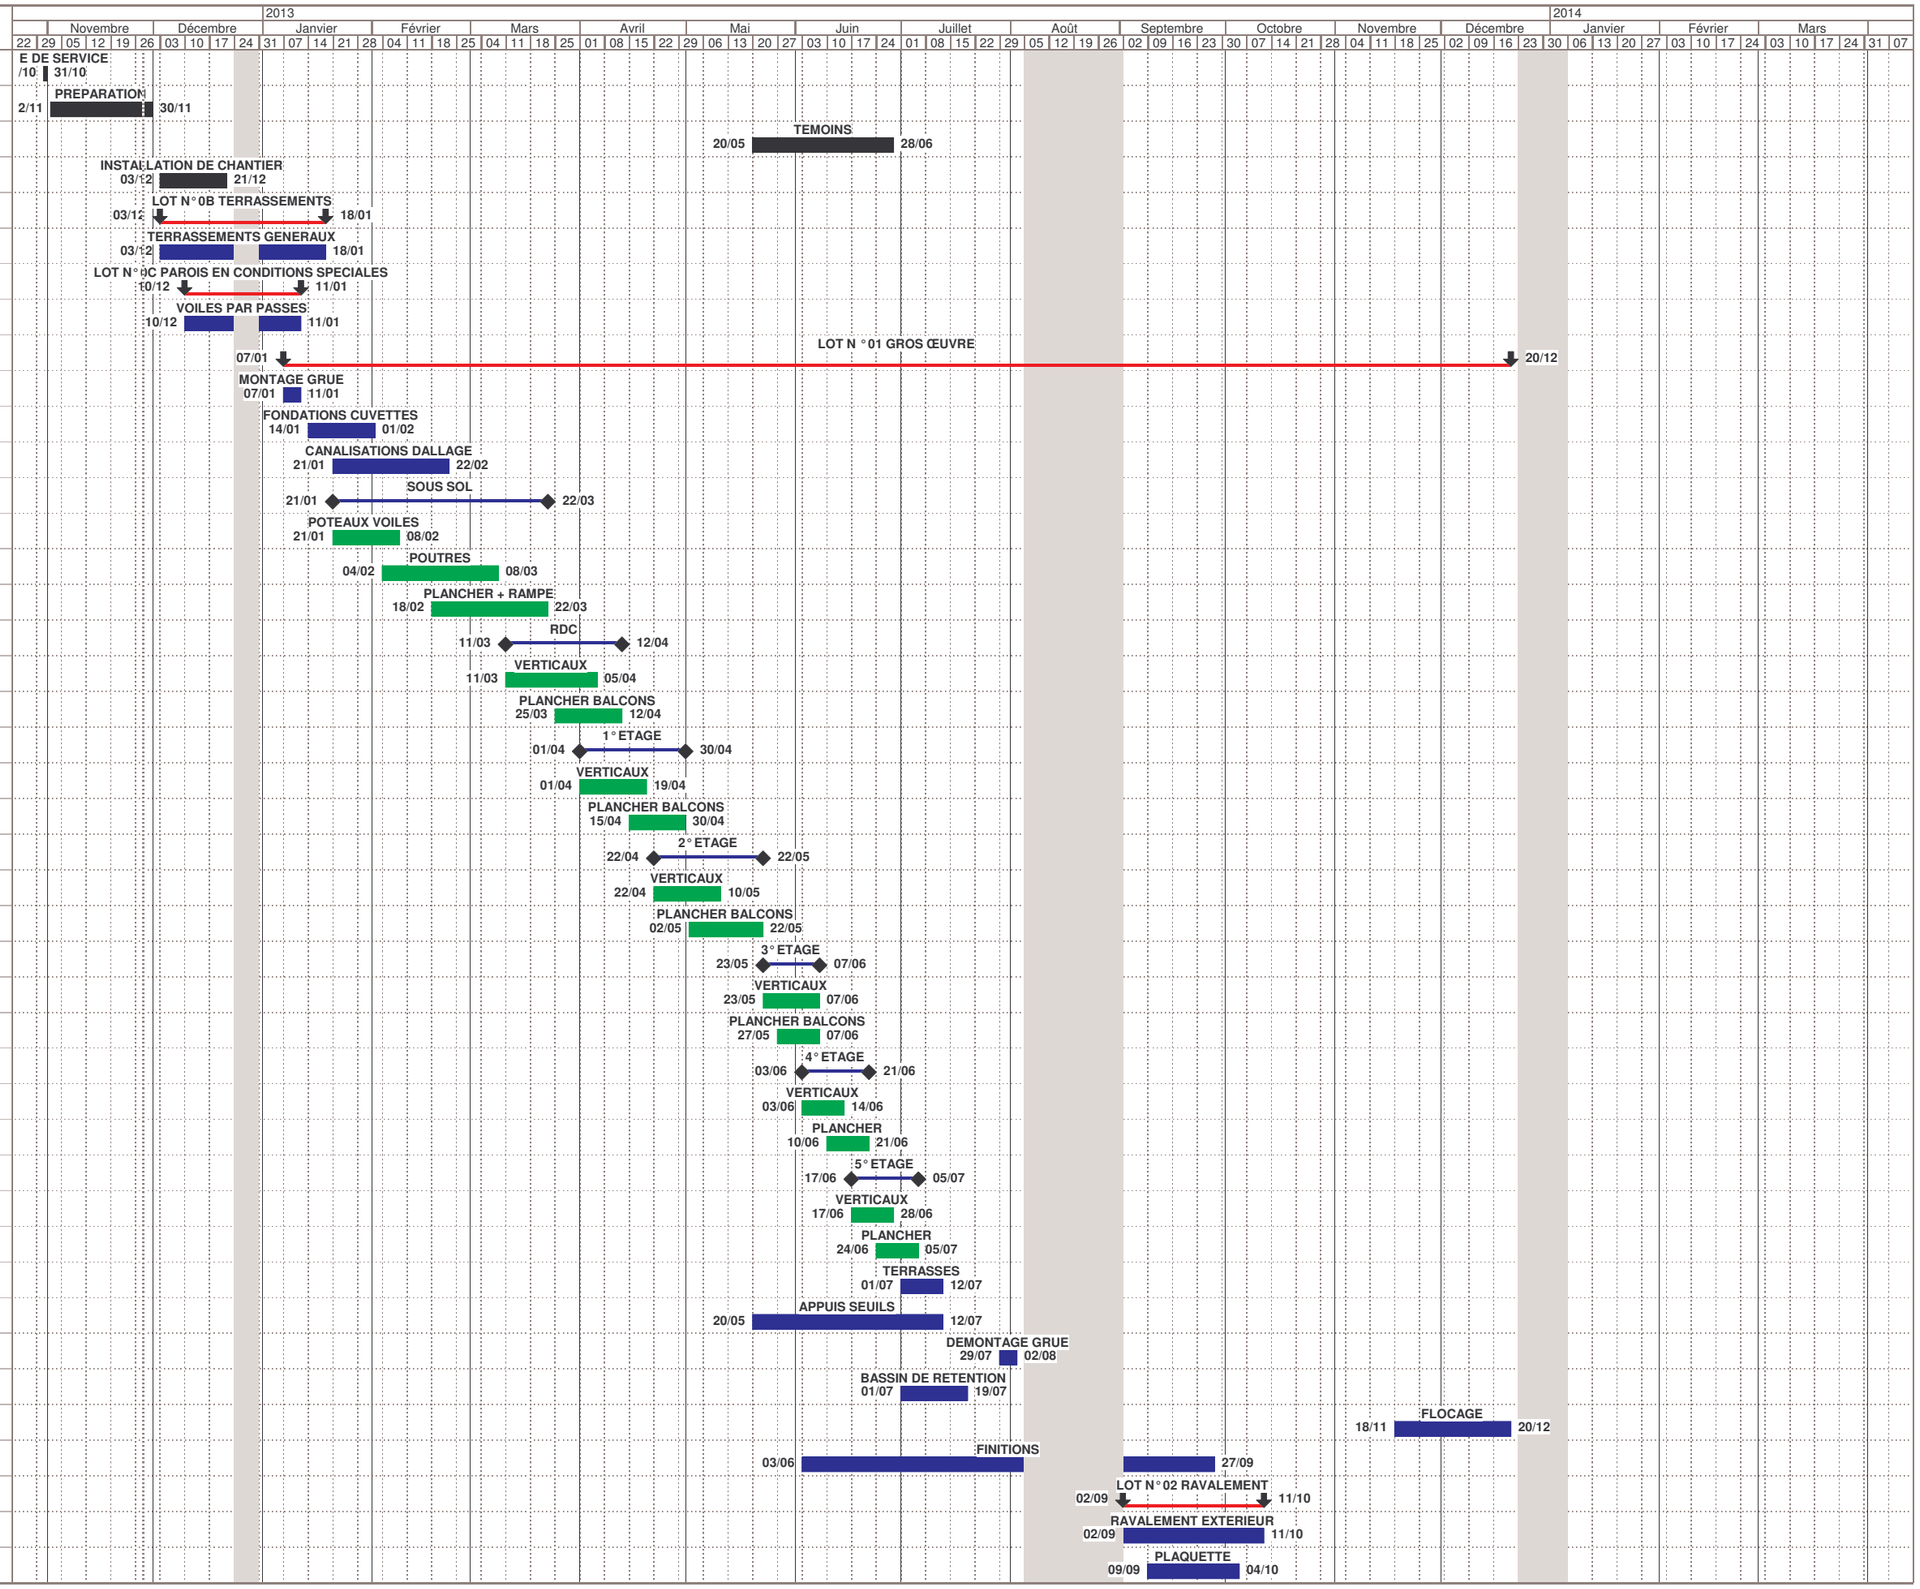

GRIVEAU SARL

PLANNING TCE

IND 0 =>PREMIERE DIFFUSION =>

PROMOGIM

AULNAY SOUS BOIS

N°	Nom de la tâche	Début	Fin
44	LOT N°03 ETANCHEITE	13/05	01/11
45	HORS D'EAU PROVISOIRE	13/05	24/05
46	TERRASSES INACCESSIBLES	08/07	02/08
47	TERRASSES ACCESSIBLES / BALCONS	01/07	19/07
48	TERRASSE RDC	14/10	01/11
49	DALLES GRAVILLONS	23/09	11/10
50	LOT N°06 MENUISERIES EXTERIEURES PVC	17/06	22/11
51	POSE MENUISERIES	17/06	02/08
52	QUINCAILLERIE FINITIONS	07/10	22/11
53	LOT N°07 SERRURERIE	02/09	29/11
54	GARDE CORPS EXTERIEURS SEPARATIFS	23/09	11/10
55	MAIN COURANTE	14/10	25/10
56	GRILLES DE VENTILATION	28/10	15/11
57	PORTES METALLIQUES	02/09	13/09
58	ENSEMBLE HALL D'ENTREE	18/11	29/11
59	LOT N°08 PORTES DE PARKING ET DE BOXES	14/10	31/01
60	PORTE DE PARKING	14/10	18/10
61	AUTOMATISATION	27/01	31/01
62	LOT N°09 MENUISERIES INTERIEURES	21/01	14/02
63	FOURNITURE HUISSERIES BETON	21/01	01/03
64	FOURNITURE HUISSERIES PLACO TRAPPES	24/06	02/08
65	PLINTHES HABILLAGES	02/09	15/11
66	PORTES PARTIES COMMUNES	18/11	29/11
67	FACADES GAINES TECHNIQUES	04/11	29/11
68	PORTES PALIERES	21/10	06/12
69	PLACARDS	02/12	24/01
70	PORTES DISTRIBUTION / QUINCAILLERIE	02/12	24/01
71	EQUIPEMENT HALLS	03/02	14/02
72	ORGANIGRAMME CONCEPTION	30/09	25/10
73	LOT N°11 CLOISONS DOUBLAGES	24/06	25/10
74	CLOISONS DOUBLAGES	24/06	04/10
75	BANDES ENDUITS	15/07	11/10
76	FAUX PLAFONDS	07/10	25/10
77	LOT N°12 ELECTRICITE	14/01	07/03
78	TERRE	14/01	01/02
79	INCORPORATIONS	18/02	28/06
80	RESEAU SOUS SOL	13/05	28/06
81	COLONNES MONTANTES	04/11	29/11
82	DESCENTES	01/07	04/10
83	DISTRIBUTION RATTRAPAGE	15/07	18/10
84	SERVICES GENERAUX	07/10	01/11
85	PARKING	13/05	28/06
86	TELEPHONE TELEVISION	02/09	01/11

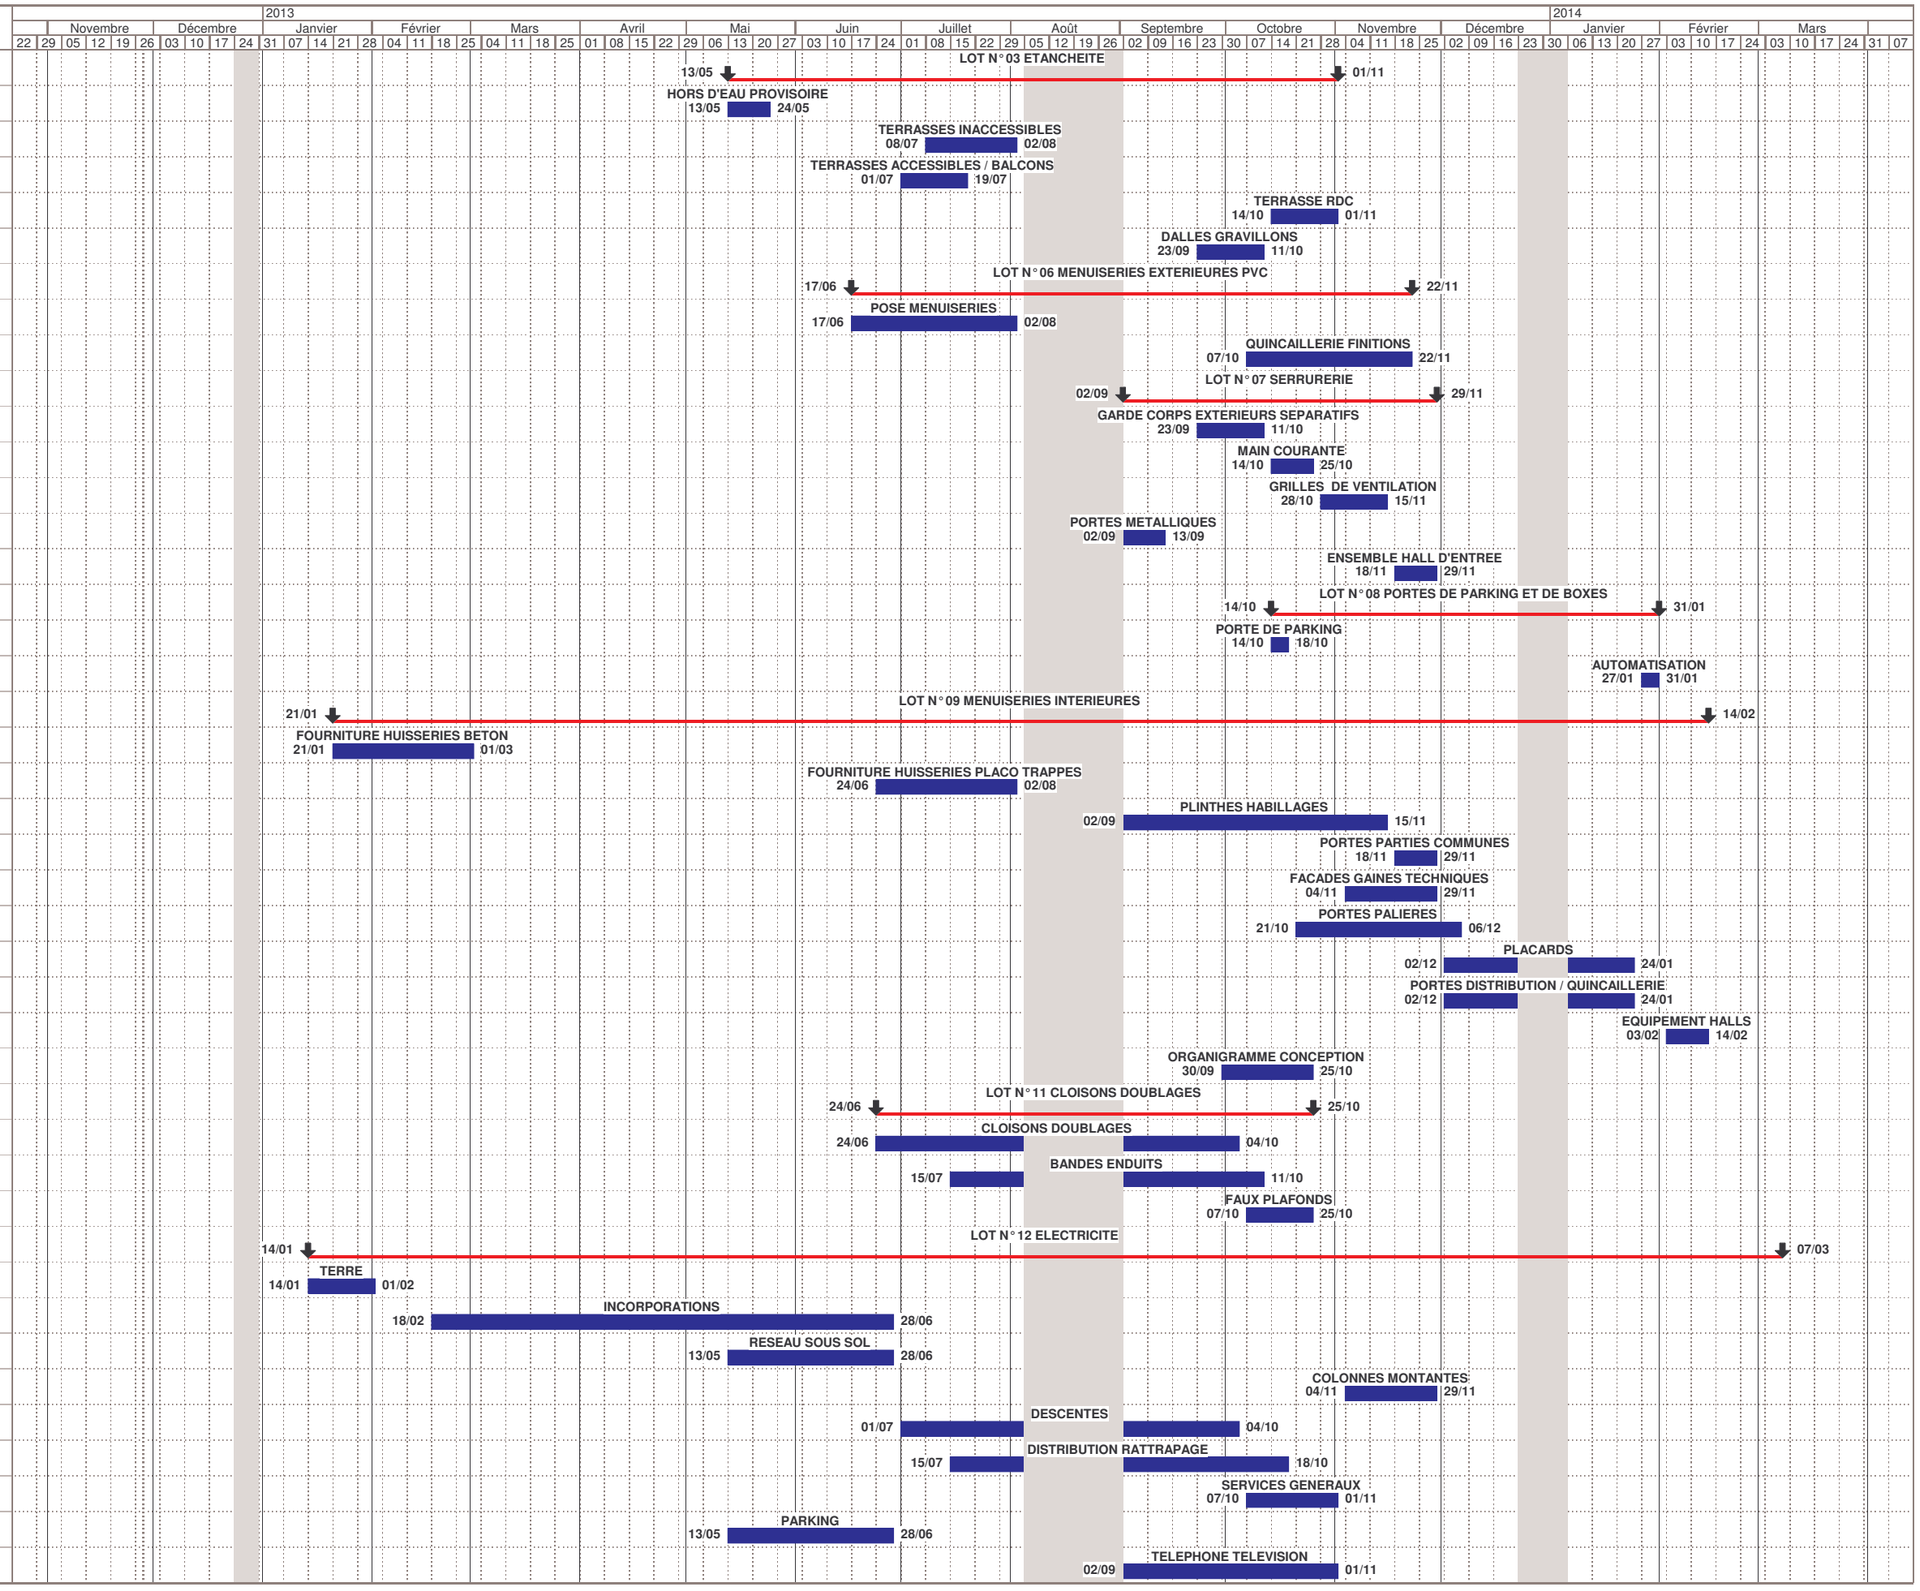

GRIVEAU SARL

PLANNING TCE

IND 0 =>PREMIERE DIFFUSION =>

PROMOGIM

AULNAY SOUS BOIS

N°	Nom de la tâche	Début	Fin
87	ECLAIRAGE DE SECURITE	04/11	22/11
88	ECLAIRAGE EXTERIEUR	09/12	20/12
89	ALARMES	04/11	22/11
90	CONTRÔLE D'ACCES	02/12	20/12
91	TABLEAUX D'ABONNES	25/11	10/01
92	APPAREILLAGE	09/12	07/02
93	ESSAIS	06/01	14/02
94	COMPTEURS	17/02	28/02
95	CONSUEL	03/03	07/03
96	LOT N°13 A CHAUFFAGE GAZ PRODUCTION D'EAU CHAUDE	18/02	14/02
97	INCORPORATIONS	18/02	21/06
98	RESEAUX SOUS SOL	29/04	21/06
99	COLONNES MONTANTES	24/06	02/08
100	PE / REBOUCHAGES	17/06	02/08
101	DISTRIBUTION / MISE EN EAU	15/07	25/10
102	CHAUFFERIE GAZ	28/10	22/11
103	ALIMENTATION GAZ	25/11	06/12
104	CONDUIT DE FUMEE	28/10	08/11
105	RADIATEURS / ESSAIS	09/12	07/02
106	BALLONS D'EAU CHAUDE	18/11	06/12
107	RACCORDEMENTS ELECTRIQUES	09/12	20/12
108	ESSAIS	06/01	14/02
109	LOT N°14 VENTILATION MECANIQUE CONTROLEE	17/06	07/02
110	GAINES / REBOUCHAGE	17/06	27/09
111	CONDUITS	22/07	20/09
112	PARKING	30/09	25/10
113	BOUCHES	09/12	31/01
114	RACCORDEMENTS ELECTRIQUES	28/10	08/11
115	ESSAIS	06/01	07/02
116	LOT N°15 PLOMBERIE SANITAIRE	18/02	14/02
117	INCORPORATIONS	18/02	21/06
118	RESEAUX SOUS SOL	29/04	14/06
119	COLONNES MONTANTES	17/06	02/08
120	PE / REBOUCHAGES	17/06	02/08
121	DISTRIBUTION / MISE EN EAU	15/07	25/10
122	BAIGNOIRES BACS A DOUCHES	02/09	25/10
123	LOCAL EAU	28/10	08/11
124	APPAREILLAGE	11/11	31/01
125	MIROIRS BANDEAUX	06/01	07/02
126	ESSAIS CALORIFUGE	06/01	07/02
127	DESINFECTION DU RESEAU	10/02	14/02
128	LOT N°16 PEINTURE	02/09	14/02
129	ENDUITS IMPRESSION	02/09	15/11

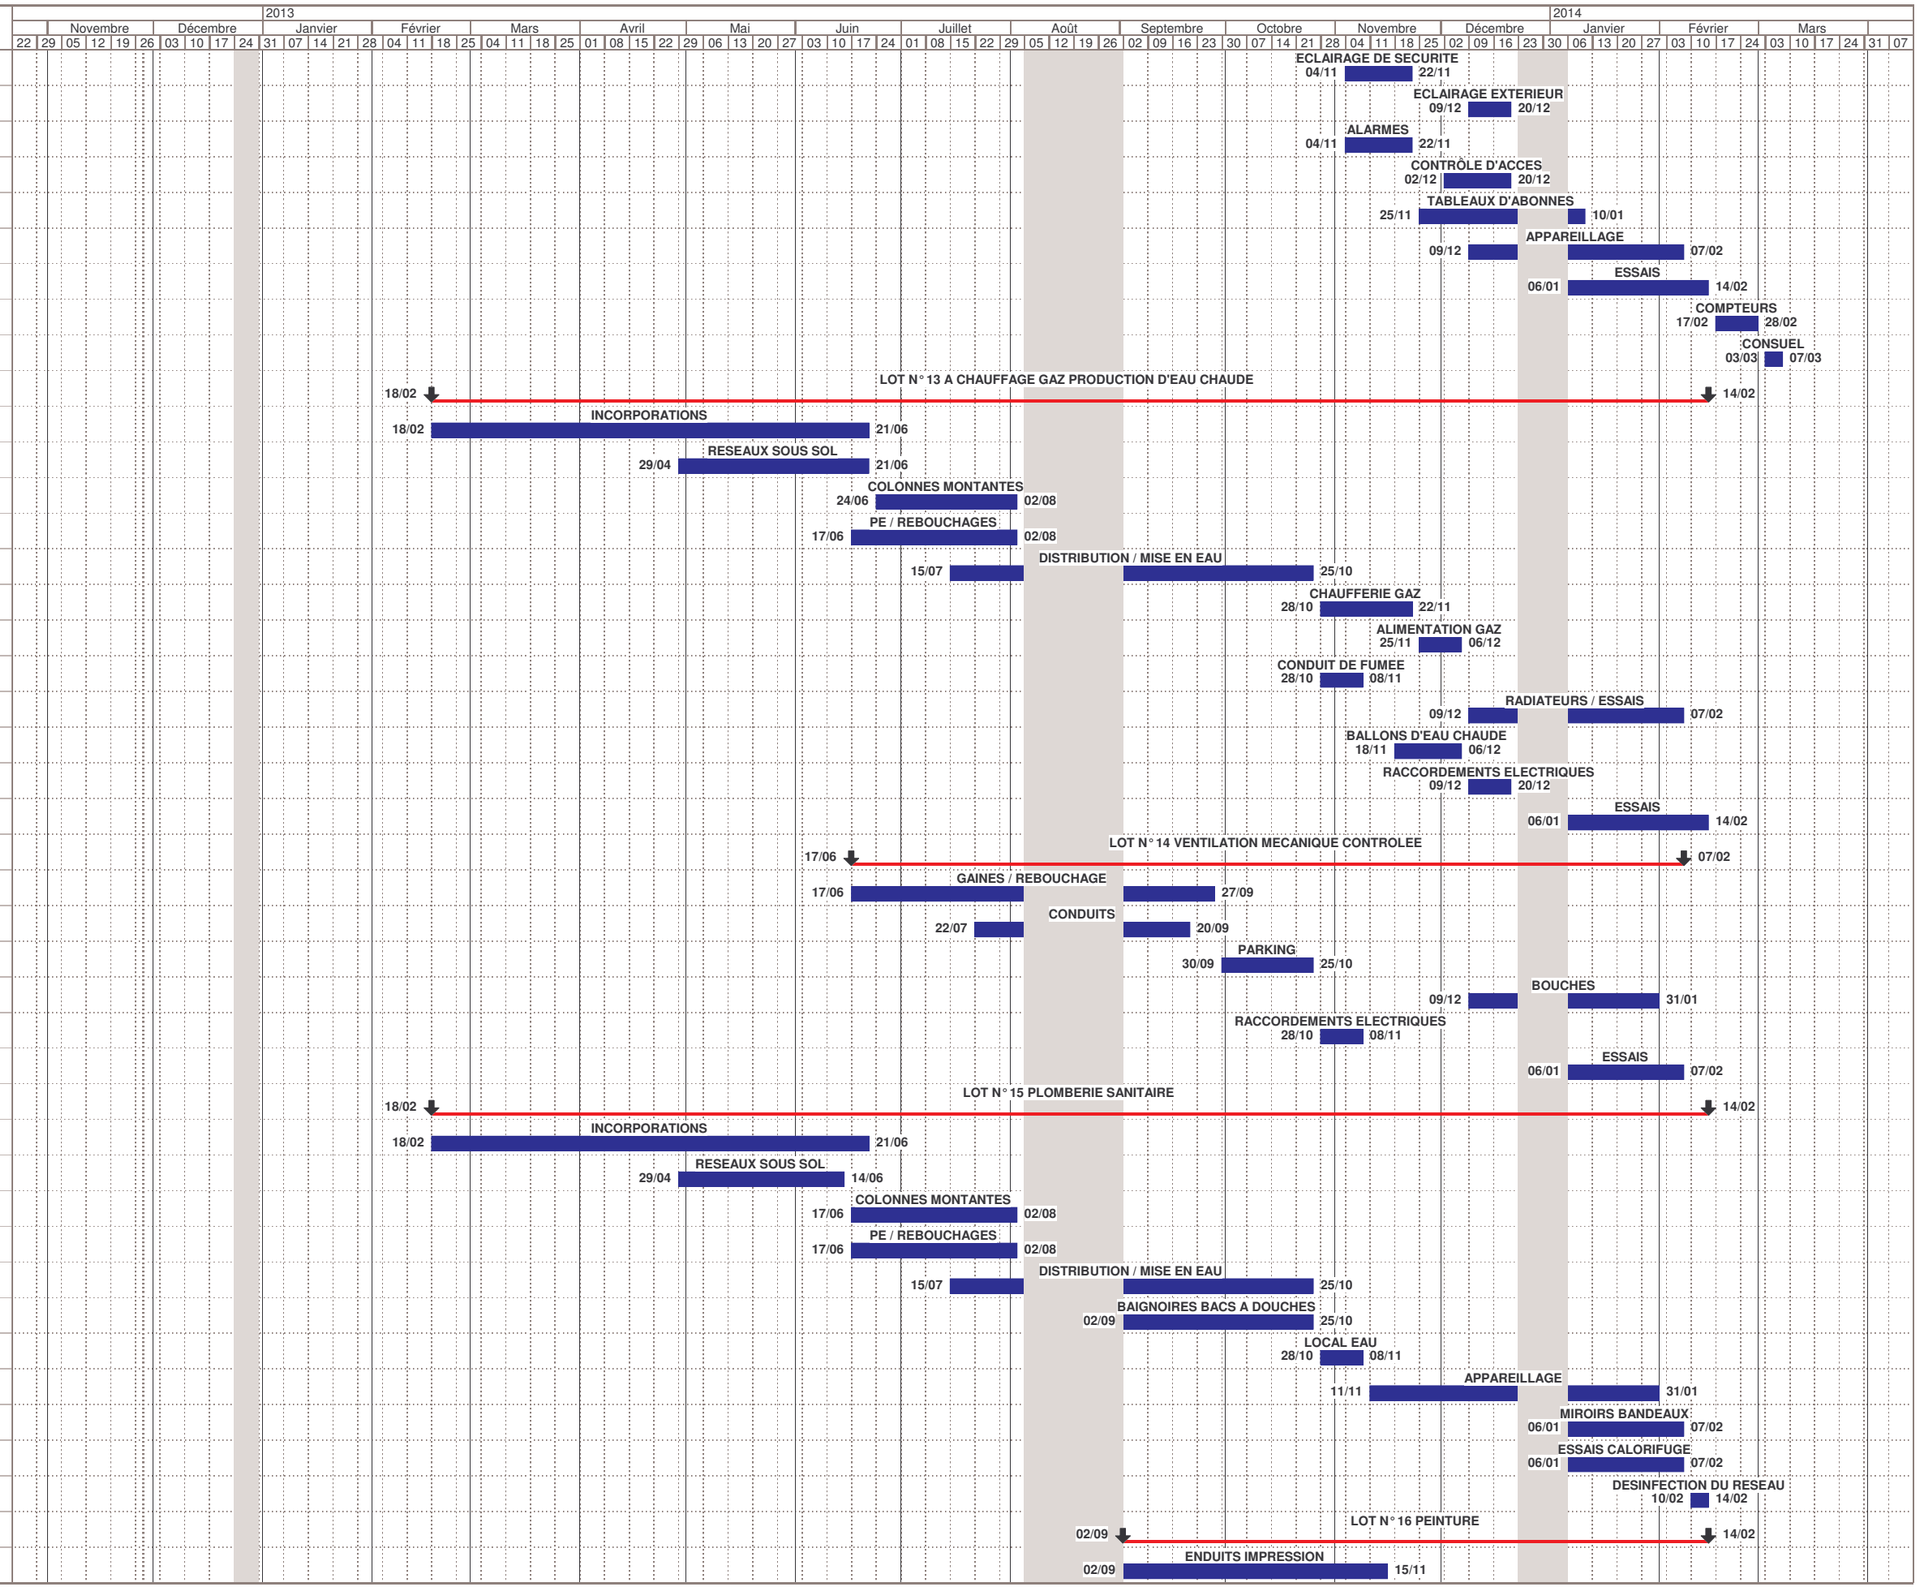

GRIVEAU SARL

PLANNING TCE

IND 0 =>PREMIERE DIFFUSION =>

PROMOGIM

AULNAY SOUS BOIS
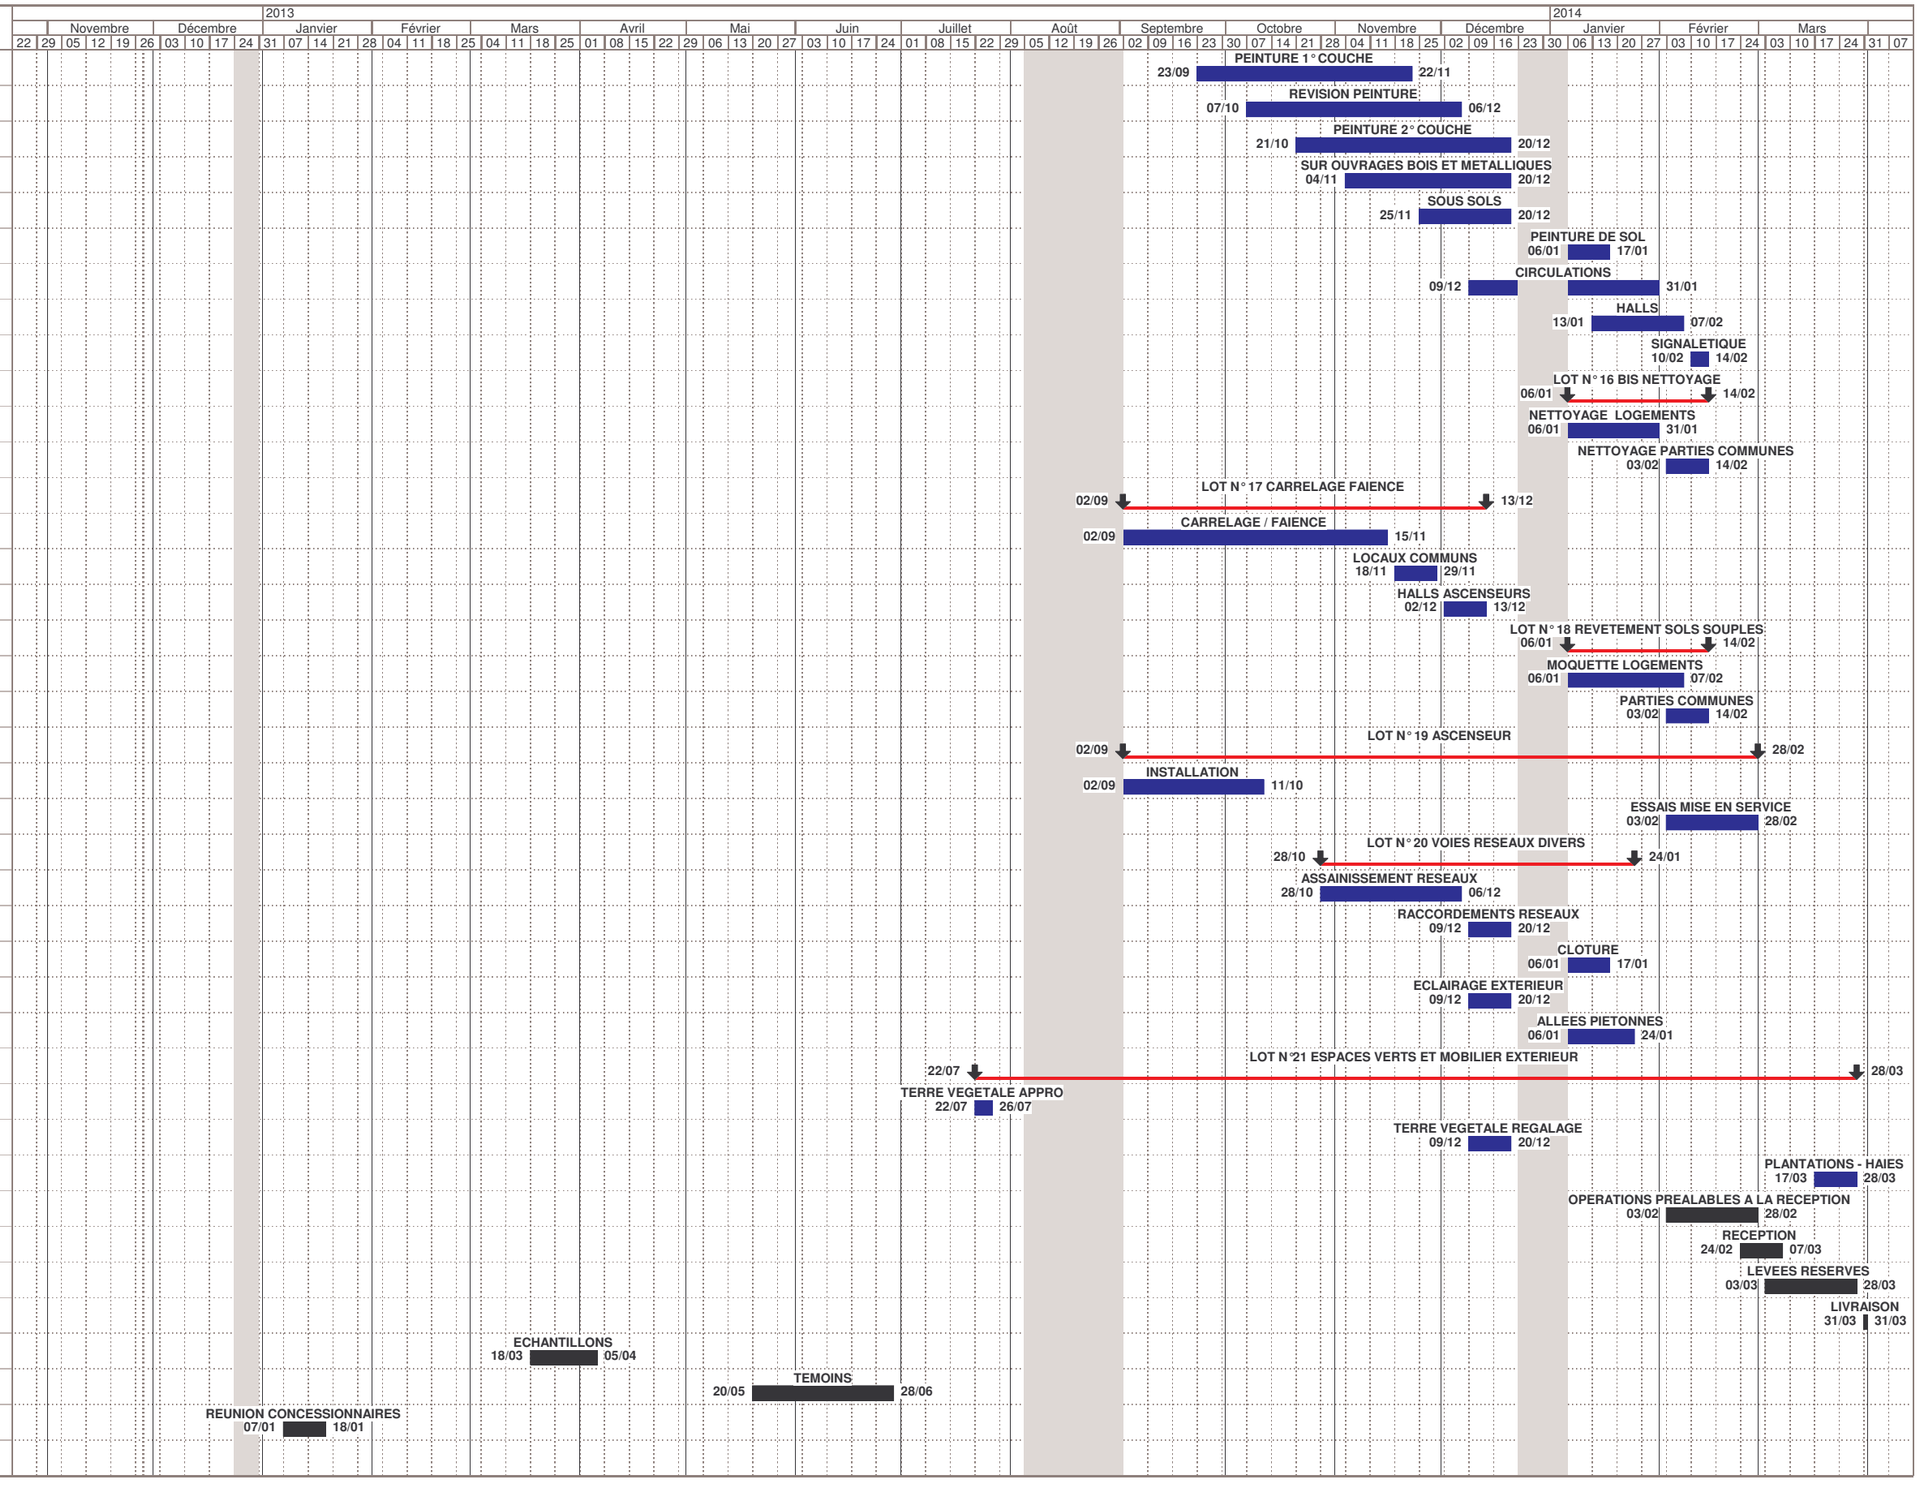
N°	Nom de la tâche	Début	Fin
130	PEINTURE 1° COUCHE	23/09	22/11
131	REVISION PEINTURE	07/10	06/12
132	PEINTURE 2° COUCHE	21/10	20/12
133	SUR OUVRAGES BOIS ET METALLIQUES	04/11	20/12
134	SOUS SOLS	25/11	20/12
135	PEINTURE DE SOL	06/01	17/01
136	CIRCULATIONS	09/12	31/01
137	HALLS	13/01	07/02
138	SIGNALETIQUE	10/02	14/02
139	LOT N° 16 BIS NETTOYAGE	06/01	14/02
140	NETTOYAGE LOGEMENTS	06/01	31/01
141	NETTOYAGE PARTIES COMMUNES	03/02	14/02
142	LOT N° 17 CARRELAGE FAIENCE	02/09	13/12
143	CARRELAGE / FAIENCE	02/09	15/11
144	LOCAUX COMMUNS	18/11	29/11
145	HALLS ASCENSEURS	02/12	13/12
146	LOT N° 18 REVETEMENT SOLS SOUPLES	06/01	14/02
147	MOQUETTE LOGEMENTS	06/01	07/02
148	PARTIES COMMUNES	03/02	14/02
149	LOT N° 19 ASCENSEUR	02/09	28/02
150	INSTALLATION	02/09	11/10
151	ESSAIS MISE EN SERVICE	03/02	28/02
152	LOT N° 20 VOIES RESEAUX DIVERS	28/10	24/01
153	ASSAINISSEMENT RESEAUX	28/10	06/12
154	RACCORDEMENTS RESEAUX	09/12	20/12
155	CLOTURE	06/01	17/01
156	ECLAIRAGE EXTERIEUR	09/12	20/12
157	ALLEES PIETONNES	06/01	24/01
158	LOT N°21 ESPACES VERTS ET MOBILIER EXTERIEUR	22/07	28/03
159	TERRE VEGETALE APPRO	22/07	26/07
160	TERRE VEGETALE REGALAGE	09/12	20/12
161	PLANTATIONS - HAIES	17/03	28/03
162	OPERATIONS PREALABLES A LA RECEPTION	03/02	28/02
163	RECEPTION	24/02	07/03
164	LEVEES RESERVES	03/03	28/03
165	LIVRAISON	31/03	31/03
166	ECHANTILLONS	18/03	05/04
167	TEMOINS	20/05	28/06
168	REUNION CONCESSIONNAIRES	07/01	18/01
169
